
แผนซ่อมแซมท่อทาง ณ คลังก๊าซเขาบ่อยา ประจำปี 2569

Project Start: 27 ต.ค. 69

No.	TASK	Note	PROGRESS	START	END
	Berth 2 หยุด 6 วัน				
1	**งานซ่อมแซมท่อ Liquid LPG 8 นิ้ว ท่าเรือหมายเลข 2**				
1.1	เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานและติดตั้งนั่งร้าน	ท่า 2	100%	22/10/69	23/10/69
1.2	ลดปริมาณ LPG และ Empty ระยะทาง 1.2 กม. (40 ม^3)	ท่า 2	0%	01/11/69	01/11/69
1.3	ติดตั้ง Blind จำนวน 3 จุด (335 ช่วงเช้า / 330 และ 304 ช่วงบ่าย)	ท่า 2	0%	02/11/69	02/11/69
1.4	N_2 Purging และตรวจสอบ Gas Free	ท่า 2	0%	02/11/69	02/11/69
1.5	Cold Cut และรื้อถอนท่อเดิม	ท่า 2	0%	03/11/69	03/11/69
1.6	ติดตั้งท่อใหม่และเชื่อม Butt Weld จำนวน 2 จุด	ท่า 2	0%	03/11/69	03/11/69
1.7	ตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธี RT	ท่า 2	0%	04/11/69	04/11/69
1.8	N_2 Purging และตรวจสอบปริมาณ O_2 ก่อนรับ LPG	ท่า 2	0%	05/11/69	05/11/69
1.9	ถอด Blind และคืนสภาพระบบท่อ	ท่า 2	0%	06/11/69	06/11/69
1.10	Fill LPG Vapor และ Liquid เพื่อเตรียมคืนระบบ	ท่า 2	0%	06/11/69	06/11/69
2	**งานซ่อมแซม CUS ท่อ Vapor LPG 4 นิ้ว ท่าเรือหมายเลข 2 บริเวณ Pipe Rack**				
2.1	Empty ระบบ	ท่า 2	0%	02/11/69	02/11/69
2.2	N_2 Purging และตรวจสอบ Gas Free ก่อนปฏิบัติงาน	ท่า 2	0%	02/11/69	02/11/69
2.3	ซ่อมสี CUS Support 32 จุด	ท่า 2	0%	03/11/69	05/11/69
2.4	Fill Vapor เพื่อเตรียมคืนระบบ	ท่า 2	0%	06/11/69	06/11/69
	Berth 3 หยุด 7 วัน				
3	**งานซ่อมแซมท่อ Liquid LPG 8 นิ้ว ท่าเรือหมายเลข 3**				
3.1	เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานและติดตั้งนั่งร้าน	ท่า 3	100%	22/10/69	23/10/69
3.2	ลดปริมาณ LPG และ Empty ระยะทาง 1.2 กม. (40 ม^3)	ท่า 3	0%	11/11/69	11/11/69
3.3	ติดตั้ง Blind จำนวน 3 จุด (334 ช่วงเช้า / 316 ช่วงบ่าย)	ท่า 3	0%	12/11/69	12/11/69
3.4	N_2 Purging และตรวจสอบ Gas Free	ท่า 3	0%	12/11/69	12/11/69
3.5	Cold Cut และรื้อถอนท่อเดิม	ท่า 3	0%	13/11/69	13/11/69
3.6	ติดตั้งท่อใหม่และเชื่อม Butt Weld จำนวน 2 จุด	ท่า 3	0%	13/11/69	13/11/69
3.7	ตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธี RT	ท่า 3	0%	15/11/69	15/11/69
3.8	N_2 Purging และตรวจสอบปริมาณ O_2 ก่อนรับ LPG	ท่า 3	0%	16/11/69	16/11/69
3.9	ถอด Blind และคืนสภาพระบบท่อ	ท่า 3	0%	17/11/69	17/11/69
3.10	เติม LPG Vapor และ Liquid เพื่อเตรียมคืนระบบ	ท่า 3	0%	17/11/69	17/11/69
4	**งานซ่อมแซม CUS ท่อ Vapor LPG 4 นิ้ว ท่าเรือหมายเลข 3 บริเวณ Pipe Rack+Shoreline**				
4.1	เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานและติดตั้งนั่งร้าน	ท่า 3	100%	22/10/69	25/10/69
4.2	งานเชื่อมท่อ Spool	ท่า 3	100%	24/10/69	26/10/69
4.3	NDT RT Spool	ท่า 3	0%	04/11/69	04/11/69
4.4	Empty ระบบ	ท่า 3	0%	12/11/69	12/11/69
4.5	N_2 Purging และตรวจสอบ Gas Free	ท่า 3	0%	12/11/69	12/11/69
4.6	**Shoreline** Cold Cut และรื้อถอนท่อเดิม	ท่า 3	0%	14/11/69	14/11/69
4.7	**Shoreline** ติดตั้งท่อใหม่และเชื่อม Butt Weld จำนวน 2 จุด	ท่า 3	0%	14/11/69	14/11/69
4.8	**Pipe Rack** Cold Cut และรื้อถอนท่อเดิม	ท่า 3	0%	15/11/69	15/11/69
4.9	**Pipe Rack** ติดตั้งท่อใหม่และเชื่อม Butt Weld จำนวน 2 จุด	ท่า 3	0%	15/11/69	15/11/69
4.10	ตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธี RT	ท่า 3	0%	15/11/69	15/11/69
4.11	ซ่อมสี CUS Support 32 จุด	ท่า 3	0%	13/11/69	15/11/69



No.	TASK	Note	PROGRESS	START	END
4.12	N_2 Purging และตรวจสอบปริมาณ O_2 ก่อนรับ LPG	ท่า 3	0%	16/11/69	16/11/69
4.13	ถอด Blind และคืนสภาพระบบท่อ	ท่า 3	0%	16/11/69	16/11/69
4.14	Fill LPG Vapor เพื่อเตรียมคืนระบบ	ท่า 3	0%	17/11/69	17/11/69

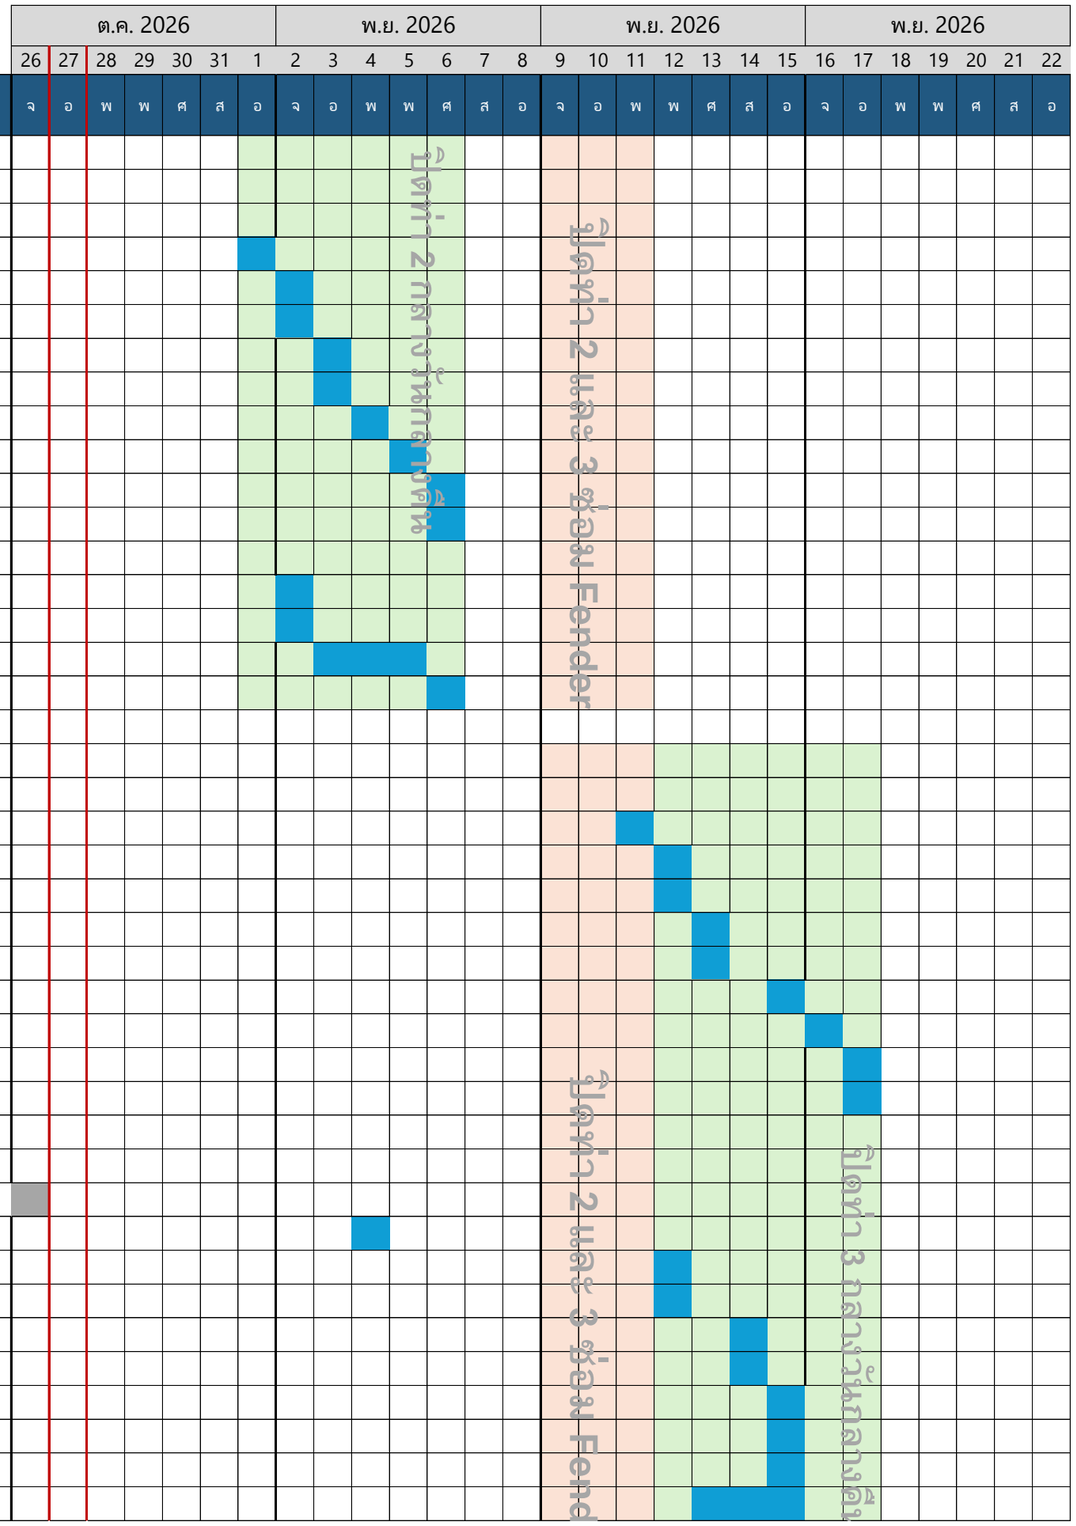
